


**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES: TRAMO 1:
ACCO MARCA - PALLCAPAMPA - NUEVA ESPERANZA (R0901061), TRAMO 2: EMP. PE -
26 (SACHAPITE - VISTA ALEGRE) (HV - 791) Y TRAMO 3: EMP. HV-112
(PARCCACANCHA) - PARCCACANCHA (R090117), DISTRITOS HUACHOCOLPA Y
YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO HUANCAVELICA**

EMPRESA GANADOR	: CONSORCIO YAULI
REPRESENTANTE LEGAL	: ZOSIMO A. FERNANDEZ QUISPE
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. ALAN ANGEL ROJAS ROMANI
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. SEVERO CHUMBEZ GOMEZ
CONTRATO	: CONTRATO N° 52 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 130 - 2020-GM/MPH (INSPECTOR)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 439 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 1, 220,608.16 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL	: S/. 27,000.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE HUACHOCOLPA Y YAULI
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 17+900 KM.
RESOL. DE APROB. PLAN TRABAJO	: R.G. N° 024-2020- GINPLAT/GM/MPH
CONTRATO	: CONTRATO N° 052-2020-GM/MPH
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	: 07/09/2020
MODALIDAD	: A SUMA ALZADA
CONTRATISTA	: CONSORCIO YAULI
REPRESENTANTE LEGAL	: SR. ZÓSIMO A. FERNÁNDEZ QUISPE
MONTO CONTRACTUAL	: S/. 1, 220,608.16 SOLES.
MONTO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II	: S/. 1,013,104.78 SOLES.
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. ALAN ANGEL ROJAS ROMANI
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	: 439 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	: 07 DE SETIEMBRE DEL 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE I	: 20 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE PLAN DE TRABAJO	: 08 DE SETIEMBRE DEL 2020
APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO	: 10/11/2020 R.G. N° 024-2020-GINPLAT/GM/MPH
NOTIFICACIÓN APROB. PLAN DE TRABAJO	: 10/11/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE II .	: 54 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE FASE II	: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020
VALORIZACIÓN 01 (NOV. 37.60%)	: S/. 380,959.19 SOLES
VALORIZACIÓN 02 (DIC. 9.06%)	: S/. 91,800.20 SOLES
FECHA DE TÉRMINO DE FASE II	: 03 DE ENERO DEL 2021
AMPLIACIÓN DE PLAZO	: ADENDA N° 001-2021-GM/MPH (12 DÍAS CALENDARIOS)
FECHA 01 DE TÉRMINO DE FASE II	: 15 DE ENERO DEL 2021
SUSPENSIÓN DEL MANT. PERIÓDICO	: 02 DE ENERO DEL 2021
REINICIO DEL MANT. PERIÓDICO	: 17/05/2021
PENDIENTE DE VAL. PERIOD. 2021	: S/. 540,345.38 SOLES (53.34%)
FECHA 02 DE TÉRMINO DE FASE II	: 30/05/2021
ACTA DE TERMINACIÓN (FASE II)	: 15 DE JUNIO DEL 2021
INICIO DE LA FASE III	: 16 DE JUNIO DEL 2021
PLAZO EJECUCIÓN DEL MANT. RUTINARIO	: 360 DÍAS CALENDARIOS
CULMINACION DEL MANT RUTINARIO	: 10 DE JUNIO DEL 2022
MANTEN. RUTINARIO 2021-2022	: S/. 183,091.22 SOLES
ICV POR PAGAR 2022	: S/. 12,206.08 SOLES
PLAZO EJECUCIÓN DEL ICV	: 05 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE ELABORACIÓN DEL ICV	: AL DÍA SIGUIENTE DE ACTA DE TERMINACIÓN DE FASE III
ESTADO ACTUAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO

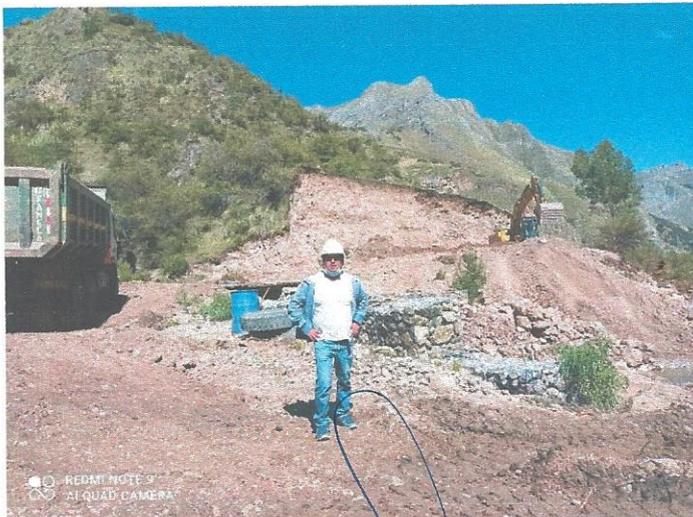


**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCAVELICA**
 Ing. Luis F. Quispe Chuquillanqui
 CIP. 107375
 ADMINISTRADOR TECNICO
