
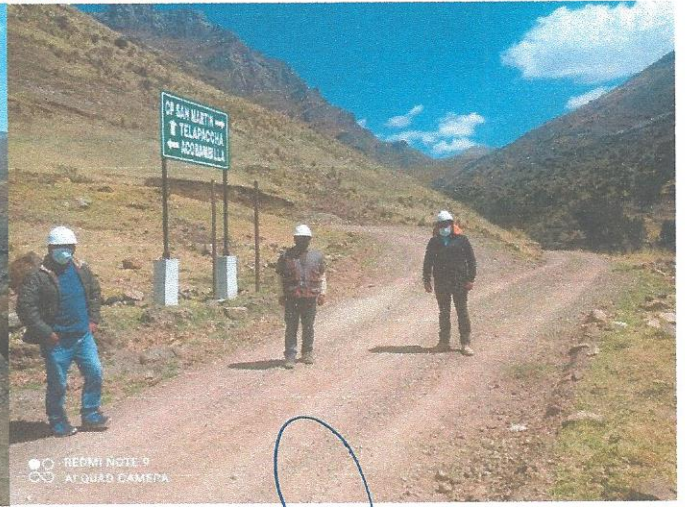


**MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. HV 110  
(ACOBAMBILLA) - TELAPACCHA - EMP. HV 132 (COTAY), ACCESO: DV. PUITUCO -  
PUITUCO (R090108, R090110), DISTRITO ACOBAMBILLA, PROVINCIA HUANCVELICA -  
DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**

EMPRESA GANADOR	: CONSORCIO SAN JUAN
REPRESENTANTE LEGAL	: RENEE CCENCHO ESPINOZA
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. ABNER ISAI OLARTE BENDEZU
INSPECTOR	: ING. EDGAR AYUQUE ANCCASI
CONTRATO	: CONTRATO N° 045 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR) DESDE EL 18 AGOSTO 2021
CONTRATO	: CONTRATO N° 34 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 478 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 4, 770,000.00 (EJECUTOR)
ADELANTO DIRECTO	: S/. 1, 431,000.00 SOLES
VALOR REFERENCIAL INSPECTOR	: S/. 54,250.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE ACOBAMBILLA
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 57+017 KM.
N° RES APROBACION	: R.G. N° 014-2020-GINPLAT/GM/MPH
DURAC. PLAN DE TRABAJO	: 20 DIAS
DURAC. DEL M. PERIODICO	: 93 DIAS
DURAC. DEL M. RUTINARIO	: 365 DIAS
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	: 07/09/2020
MODALIDAD	: A SUMA ALZADA
CONTRATISTA	: CONSORCIO SAN JUAN
REPRESENTANTE LEGAL	: SR. RENEE CCENCHO ESPINOZA
MONTO CONTRACTUAL	: S/. 4, 770,000.00 SOLES.
MONTO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II	: S/. 3, 959,100.00 SOLES.
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	: 08/09/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE I	: 20 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE PLAN DE TRABAJO	: 08/09/2020
APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO	: 12/10/2020 R.G. N° 014-2020-GINPLAT/GM/MPH
NOTIFICACIÓN APROB. PLAN DE TRABAJO	: 13/10/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE II	: 93 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE FASE II	: 14/10/2020
FECHA DE TÉRMINO DE FASE II	: 14/01/2021
VAL. PERIOD. 01 (OCT. 40.61%)	: S/. 1, 607,904.12 SOLES
VAL. PERIOD. 02 (NOV. - 14.18%)	: S/. 561,522.25 SOLES
VAL. PERIOD. 03 (DIC. - 32.22%)	: S/. 1, 275,714.18 SOLES
SUSPENSIÓN DEL MANT. PERIÓDICO	: 06/01/2021
REINICIO DEL MANT. PERIÓDICO	: 24/02/2021
VAL. PERIOD. 04 (MARZ. - 12.99%)	: S/. 513,959.45 SOLES
CULMINACIÓN REAL DE FASE II	: 03/03/2021
PLAZO EJECUCIÓN DEL MANT. RUTINARIO	: 360 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE LA FASE III	: 04/03/2021
CULMINACIÓN DE FASE III	: 26/02/2021
MANTEN. RUT. VAL-01-MARZO	: S/. 55,650.00 SOLES (28 DÍAS)
MANTEN. RUT. VAL-02-ABRIL	: S/. 59,625.00 SOLES (30 DÍAS)
MANTEN. RUT. VAL-03-MAYO	: S/. 61,612.50 SOLES (31 DÍAS)
MANTEN. RUT. VAL-04-JUNIO	: S/. 59,625.00 SOLES (30 DÍAS)
MANTEN. RUT. VAL-05-JULIO	: S/. 61,612.50 SOLES (31 DÍAS)
PLAZO EJECUCIÓN DEL ICV	: 05 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE ELABORACIÓN DEL ICV	: AL DÍA SIGUIENTE DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE FASE III
ESTADO ACTUAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO

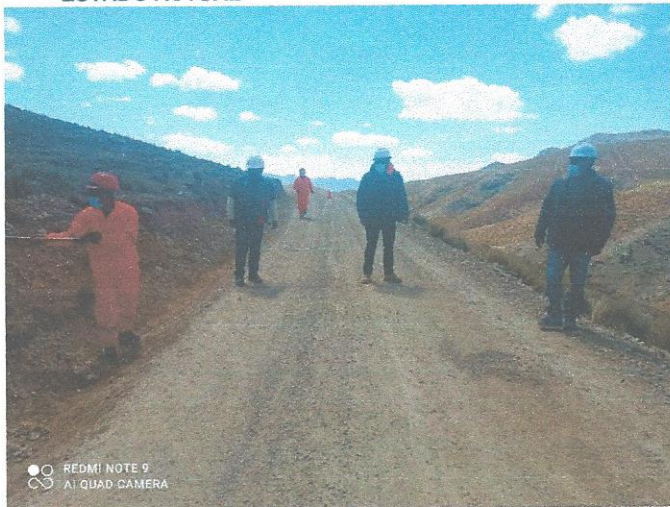

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
DE HUANCVELICA

Ing. Luis F. Quispe Choquillanqui  
CIP. 107375  
ANALISTA TÉCNICO
