


MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE 3S - PTE.
ANGASMAYO - PILCHACA - SEBASTIAN BARRANCA - EMP. HV-110 TELLERIA (HV-930),
DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAMELICA

EMPRESA GANADOR	: GIRASOL E.I.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL	: ROBERT J. ROJAS MEZA
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. GILMER UVER MARAVI BRAÑES
INSPECTOR DEL SERVICIO	: ING. JAVIER CHOQUE CONTRERAS
CONTRATO	: CONTRATO N° 45 - 2020-GM/MPH (EJECUTOR)
CONTRATO	: CLS N° 046 - 2021-GM/MPH (INSPECTOR)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: CONTRATA A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 466 DÍAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL	: S/. 1, 841,140.80 (EJECUTOR)
VALOR CORREGIDO	: S/. 1, 772,950.40 (EJECUTOR)
VALOR REFERENCIAL INSPECTOR	: S/. 30,000.00 (INSPECTOR)
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: DISTRITO DE PILCHACA
LONG. DE INTERVENCIÓN	: 26+000 KM.
RESOL. DE APROB. PLAN TRABAJO	: R.G. N° 025-2020- GINPLAT/GM/MPH
CONTRATO	: CONTRATO N° 045-2020-GM/MPH
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	: 01/10/2020
MODALIDAD	: CONTRATA A SUMA ALZADA
CONTRATISTA	: GIRASOL E.I.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL	: SR. ROBERT J. ROJAS MEZA
MONTO CONTRACTUAL	: S/. 1, 772,950.40 SOLES.
MONTO DE EJECUCIÓN DE LA FASE II	: S/. 1, 528,146.86 SOLES.
RESIDENTE DEL SERVICIO	: ING. MARCO ANTONIO HUAMAN SOTO.
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	: 466 DÍAS CALENDARIOS
DURACIÓN PLAN DE TRABAJO	: 20 DÍAS
DURACIÓN DEL MANT. PERIÓDICO	: 81 DÍAS
DURACIÓN DEL MANT. RUTINARIO	: 365 DÍAS
FECHA DE FIRMA CONTRATO	: 01 DE OCTUBRE DEL 2020
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL	: 02 DE OCTUBRE DEL 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE I	: 20 DÍAS CALENDARIOS
INICIO PLAN DE TRABAJO	: 02 DE OCTUBRE DEL 2020
APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO	: 23/11/2020 R.G. N° 025-2020 - GINPLAT/GM/MPH
NOTIFICACIÓN APROB. PLAN DE TRABAJO	: 23/11/2020.
PLAZO DE EJECUCIÓN FASE II	: 81 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE FASE II	: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020
VALORIZACIÓN 01 (NOV. - 1.47%)	: S/. 21,645.10 SOLES
VALORIZACIÓN 02 (DIC. - 33.25%)	: S/. 489,304.10 SOLES
VALORIZACIÓN 03 (DIC. - 30.29%)	: S/. 394,429.15 SOLES
FECHA DE TÉRMINO DE FASE II	: 12 DE FEBRERO DEL 2021
SUSPENSIÓN DEL MANT. PERIÓDICO	: 02 DE ENERO DEL 2021
REINICIO DEL MANT. PERIÓDICO	: 08/06/2021
PENDIENTE DE VAL. PERIÓDICO 2021	: S/. 1, 017,197.66 SOLES (65.28%)
CULMINACIÓN REAL DE FASE II	: 19/07/2021
ACTA DE TERMINACIÓN DE LA FASE II	: 02/08/2021
INICIO DE LA FASE III	: 03/08/2021
PLAZO EJECUCIÓN DEL MANT. RUTINARIO	: 360 DÍAS CALENDARIOS
CULMINACIÓN DEL MANT. RUTINARIO (FASE III)	: 28/07/2021
PLAZO EJECUCIÓN DEL ICV	: 05 DÍAS CALENDARIOS
INICIO DE ELABORACIÓN DEL ICV	: AL DÍA SIGUIENTE DE ACTA DE TERMINACIÓN FASE III
MANTEN. RUTINARIO 2021	: S/. 276,171.12 SOLES
IVC POR PAGAR 2022	: S/. 18,411.41 SOLES
ESTADO ACTUAL	: EN MANTENIMIENTO RUTINARIO.

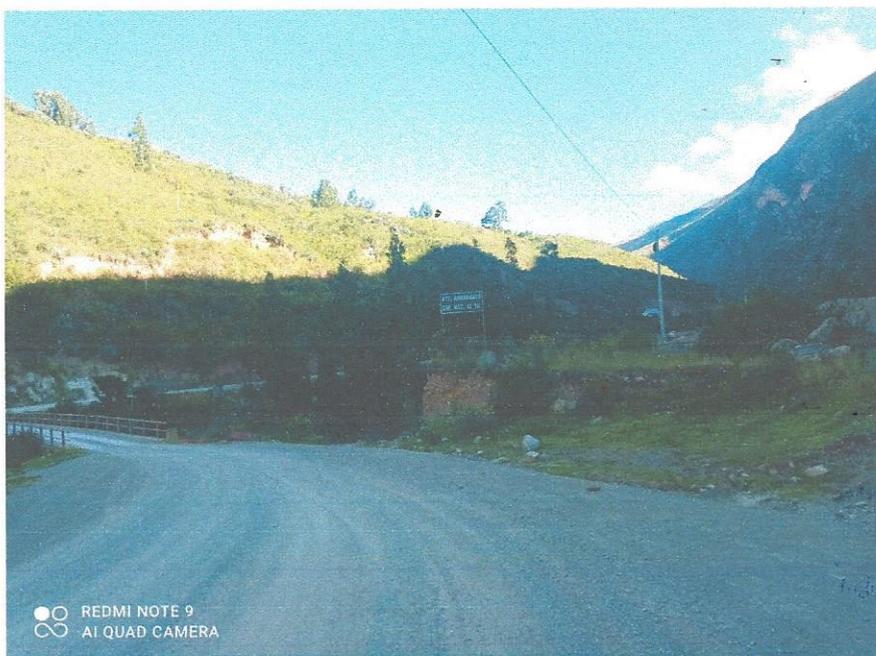

REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCAMELICA

Luis F. Quispe Chuquillanqui
CIP. 107375
ANALISTA TECNICO
